


А4.3.3 Закрытие проекта

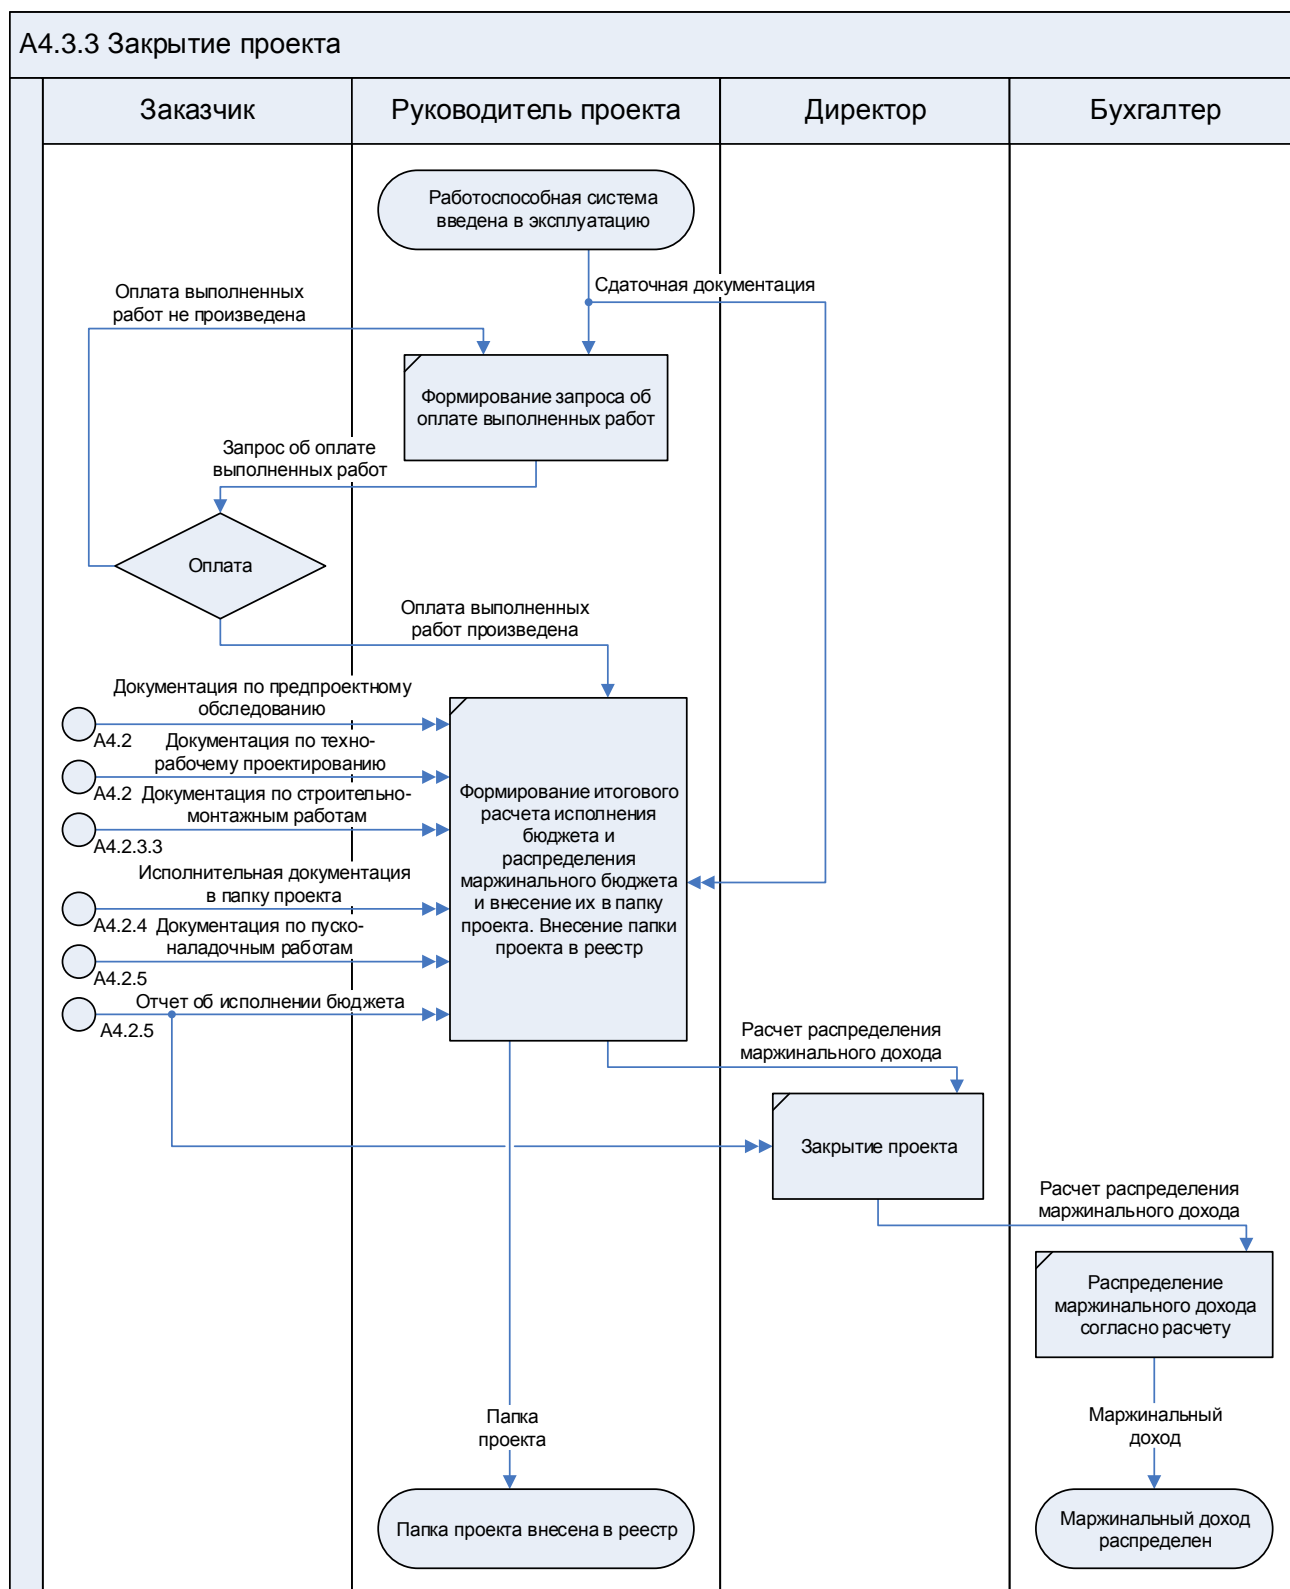

Владелец процесса

- Заместитель директора по производству

Исполнители процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Руководитель проекта

Начало выполнения: наличие утвержденной документации по вводу системы в эксплуатацию

Входы процесса

№	Название	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Документация по предпроектному обследованию	Акт выполненных работ Отчет о предпроектном обследовании	Ведущий инженер	A4.2.1 Предпроектное обследование
2.	Документация по пуско-наладочным работам	Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах	Руководитель проекта	A4.2.5 Пуско-наладочные работы
3.	Документация по строительно-монтажным работам	Акт выполненных работ Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Отчет о выполненных СМР	Руководитель проекта	A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ
4.	Документация по техно-рабочему проектированию	Акт выполненных работ Техно-рабочий проект	Ведущий инженер Руководитель проекта	A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта
5.	Исполнительная документация в папку проекта	Акт выполненных работ Исполнительная документация	Руководитель проекта	A4.2.4 Формирование исполнительной документации
6.	Отчет об исполнении бюджета	Отчет об исполнении бюджета	Руководитель проекта	A4.2.5 Пуско-наладочные работы
7.	Сдаточная документация	Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация	Руководитель проекта	A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию

Выходы процесса

№	Название	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Маржинальный доход	Деньги	Бухгалтерия	A7.2 Контроль доходов

№	Название	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
2.	Папка проекта	Акт ввода в эксплуатацию Акт выполненных работ Акт выполненных работ по пуско-наладке Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Исполнительная документация Отчет о выполненных СМР Отчет о предпроектном обследовании Отчет о пуско-наладочных работах Отчет об исполнении бюджета Сдаточная документация Техно-рабочий проект		{Туннель}

Описание подпроцессов

№	Процесс / Решение	Исполнители	Входы		Выходы	
			Объекты	Поступает от	Объекты	Передается
1.	А4.3.3.1 Формирование запроса об оплате выполненных работ	Руководитель проекта	Акт ввода в эксплуатацию	Руководитель проекта		
			Сдаточная документация	Руководитель проекта		
2.	А4.3.3.2 Оплата	Заказчик				
3.	А4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр	Руководитель проекта	Акт ввода в эксплуатацию	Руководитель проекта	Акт ввода в эксплуатацию	
			Акт выполненных работ	Руководитель проекта	Акт выполненных работ	
			Акт выполненных работ	Ведущий инженер	Акт выполненных работ по пуско-наладке	
			Акт выполненных работ	Ведущий инженер Руководитель проекта	Акт приемки площадки	
			Акт выполненных работ	Руководитель проекта	Акт сдачи площадки	

№	Процесс / Решение	Исполнители	Входы		Выходы	
			Объекты	Поступает от	Объекты	Передается
			по пуско-наладке			
			Акт приемки площадки	Руководитель проекта	Исполнительная документация	
			Акт сдачи площадки	Руководитель проекта	Отчет о выполненных СМР	
			Исполнительная документация	Руководитель проекта	Отчет о предпроектном обследовании	
			Отчет о выполненных СМР	Руководитель проекта	Отчет о пуско-наладочных работах	
			Отчет о предпроектном обследовании	Ведущий инженер	Отчет об исполнении бюджета	
			Отчет о пуско-наладочных работах	Руководитель проекта	Сдаточная документация	
			Отчет об исполнении бюджета	Руководитель проекта	Техно-рабочий проект	
			Сдаточная документация	Руководитель проекта		
			Техно-рабочий проект	Ведущий инженер Руководитель проекта		
4.	A4.3.3.4 Закрытие проекта	Директор	Отчет об исполнении бюджета	Руководитель проекта		
5.	A4.3.3.5 Распределение маржинального дохода согласно расчету	Бухгалтер			Деньги	Бухгалтерия
